

～大手門跡北側土塀・石垣復旧工事について～

10月より本格的に工事が始まりました。今号では、工事の進捗状況をご紹介します！

漆喰・土壁の撤去作業




漆喰・土壁撤去作業

漆喰や漆喰の内側に塗られた土壁に亀裂や剥がれが生じました。そのまま放置しておくと、被害が拡大しそれらが崩れ落ちる恐れがあるため、剥がして塗り直す必要があります。

土塀の構造

土壁や漆喰は数回に分けて重ね塗りを行います。

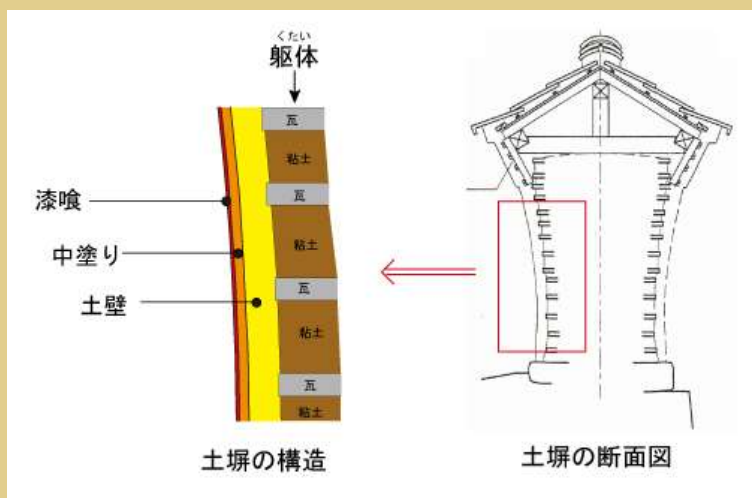

漆喰・土壁撤去後の躯体

Check!

漆喰と土壁を撤去した後の状況です！
瓦と土が交互に積み重なっているのがわかります。

土壁の塗り直し作業

土壁材



土壁塗り直し状況

塗り直し作業も全て職人による手作業で行っていきます。各段階で数ミリ～数センチ単位の厚さで塗って仕上げていきます。また、一度ではなく複数回に分けて塗っていくため、乾燥にも時間を要します。



土壁の厚さ管理

Check!

竹串をさして、塗りの厚さを管理しています。



土壁塗り直し作業の様子

新しく塗る土壁は撤去した土にスサ（稲の藁を細かく刻んだもの）を混ぜ込んだものを使っています。塗る厚さを確認しながら、手作業で行います。

【今後の工事予定】

12月以降に漆喰を塗り、仕上げていきます！



スサ
